

DEVIS — Développement

BanaCommunity

DU-2026-0619-001

PRESTATAIRE	CLIENT
Digit-Up Agency	BanaCommunity
Rue de Marcinelle 12	Attn. Nyota Delecourt – Fondatrice
6000 Charleroi – Belgique	Charleroi – Belgique
BCE : 0XXX.XXX.XXX	
TVA : BE 0XXX.XXX.XXX	
contact@digit-up.be	nyota@bana.mobi
www.digit-up.be	www.bana.mobi

Numéro de devis : DU-2026-0619-001
Date d'émission : 19/06/2026
Valable jusqu'au : 19/08/2026 (60 jours)
Référence projet : BanaCommunity – Développement complet v2
Chef de projet : Raphaël Jonard

Objet de la prestation

Suite à l'audit applicatif réalisé en juin 2026, Digit-Up Agency propose le développement des fonctionnalités manquantes de la plateforme BanaCommunity (bana.mobi), ainsi que la correction des anomalies techniques identifiées.

Le périmètre complet est défini dans le **Cahier des Charges BanaCommunity v1.0** du 19/06/2026, document contractuel joint au présent devis.

Conditions tarifaires

Poste	Taux
Développement (senior)	700,00 € HT / jour
Développement (junior)	450,00 € HT / jour

Poste	Taux
Gestion de projet	600,00 € HT / jour
Recette & déploiement	600,00 € HT / jour
TVA	21 % (Belgique)

Un jour de prestation = 8 heures. Les estimations incluent : développement, tests unitaires, revue de code et documentation technique associée.

Détail des prestations

PHASE 0 — Corrections critiques et dette technique

Priorité absolue — prérequis à toutes les autres phases

Réf.	Prestation	Complexité	Jours dev	Jours GP	Total jours	Prix HT
COR-01	Correction bug <code>stripe_customer_id</code> — ajout champ Profile, migration, tests webhook Stripe	S	2,0	0,3	2,3	1 610,00 €
COR-02	Ajout <code>@login_required</code> sur vue chat	XS	0,5	0,1	0,6	420,00 €
COR-03	Configuration CORS — <code>CORS_ALLOWED_ORIGINS</code> , suppression doublon <code>cors-middleware</code>	XS	0,5	0,1	0,6	420,00 €
COR-04	Activation bannière cookies — intégration dans les deux layouts	S	2,0	0,3	2,3	1 610,00 €
COR-05	Lien CGU dans footer et page inscription	XS	0,5	0,1	0,6	420,00 €
COR-06	Migration cache <code>LocMemCache</code> → Redis	S	1,5	0,2	1,7	1 190,00 €
COR-07	Migration Django 5.1.4 → 5.2 LTS + correction deprecation warnings + tests régression	M	4,0	0,5	4,5	3 150,00 €

Réf.	Prestation	Complexité	Jours dev	Jours GP	Total jours	Prix HT
COR-08	Personnalisation URL admin Django	XS	0,5	0,1	0,6	420,00 €
—	Recette & déploiement Phase 0	—	—	1,0	1,0	600,00 €

Sous-total Phase 0

	Jours	Montant HT
Développement senior	11,5 j × 700 €	8 050,00 €
Gestion de projet	1,7 j × 600 €	1 020,00 €
Recette & déploiement	1,0 j × 600 €	600,00 €
Total Phase 0	14,2 jours	9 670,00 € HT

PHASE 1 — Messagerie temps réel

Fonctionnalité critique — prérequis à la confiance Parent/Yaya

Réf.	Prestation	Complexité	Jours dev	Jours GP	Total jours	Prix HT
MSG-01	Modèles Conversation , Message , MessageReadStatus + migrations	S	1,5	0,2	1,7	1 170,00 €
MSG-02	Consumer WebSocket authentifié (ChatConsumer) + routing ASGI + gestion déconnexion	M	5,0	0,5	5,5	3 800,00 €
MSG-03	Vues et URLs (liste conversations, détail, démarrer, mark-read, unread-count)	M	4,0	0,4	4,4	3 040,00 €
MSG-04	Templates UI messagerie (liste + bulles conversation) + JS WebSocket client	M	5,0	0,5	5,5	3 800,00 €
MSG-05	Badge messages non lus dans le header (HTMX polling + mise à jour WS)	S	1,5	0,2	1,7	1 170,00 €
MSG-06	Boutons "Contacter" sur profil public et pages de matching	S	1,5	0,2	1,7	1 170,00 €

Réf.	Prestation	Complexité	Jours dev	Jours GP	Total jours	Prix HT
—	Recette & déploiement Phase 1	—	—	2,0	2,0	1 200,00 €

Sous-total Phase 1

	Jours	Montant HT
Développement senior	18,5 j × 700 €	12 950,00 €
Gestion de projet	2,0 j × 600 €	1 200,00 €
Recette & déploiement	2,0 j × 600 €	1 200,00 €
Total Phase 1	22,5 jours	15 350,00 € HT

PHASE 2 — Système de notifications

Requise pour activer la Formule Essentiel complète

Réf.	Prestation	Complexité	Jours dev	Jours GP	Total jours	Prix HT
NOTIF-01	Module emails transactionnels : 7 emails (nouvelle réservation, confirmation, annulation, matching, rappel J-1, abonnement actif, expiration) + templates HTML	M	5,0	0,5	5,5	3 800,00 €
NOTIF-02	Push notifications Web : clés VAPID, modèle PushSubscription , API subscription JS, envoi push via pywebpush	L	8,0	0,8	8,8	6 080,00 €
NOTIF-03	Page préférences de notifications (email/push par catégorie) dans le profil	S	2,0	0,3	2,3	1 610,00 €
—	Recette & déploiement Phase 2	—	—	1,5	1,5	900,00 €

Sous-total Phase 2

	Jours	Montant HT
Développement senior	15,0 j × 700 €	10 500,00 €
Gestion de projet	1,6 j × 600 €	960,00 €
Recette & déploiement	1,5 j × 600 €	900,00 €
Total Phase 2	18,1 jours	12 360,00 € HT

PHASE 3 — Calendrier et Planification

Fonctionnalité centrale de la Formule Confort (149 €/an)

Réf.	Prestation	Complexité	Jours dev	Jours GP	Total jours	Prix HT
CAL-01	Modèle YayaUnavailability + migration + impact sur le moteur de matching	S	1,5	0,2	1,7	1 170,00 €
CAL-02	Vue calendrier mensuel/ hebdomadaire + endpoint JSON events + intégration FullCalendar.js	L	8,0	0,8	8,8	6 080,00 €
CAL-03	CRUD indisponibilités Yaya (ajout, liste, suppression)	M	3,0	0,3	3,3	2 280,00 €
CAL-04	Management command send_trip_reminders + configuration cron production	M	3,0	0,3	3,3	2 280,00 €
CAL-05	Calendrier familial partagé (dépend Phase 7 — MULTI-01)	M	4,0	0,4	4,4	3 040,00 €
—	Recette & déploiement Phase 3	—	—	2,0	2,0	1 200,00 €

Sous-total Phase 3

	Jours	Montant HT
Développement senior	19,5 j × 700 €	13 650,00 €
Gestion de projet	2,0 j × 600 €	1 200,00 €
Recette & déploiement	2,0 j × 600 €	1 200,00 €

	Jours	Montant HT
Total Phase 3	23,5 jours	16 050,00 € HT

PHASE 4 — Défraiement et Paiements Inter-Utilisateurs

Requise pour la viabilité économique du modèle Yaya

Réf.	Prestation	Complexité	Jours dev	Jours GP	Total jours	Prix HT
DEF-01	Modèles DefraimentRate et TripPayment + migration + admin Django	S	1,5	0,2	1,7	1 170,00 €
DEF-02	Calcul automatique du défraiement à la confirmation de réservation	M	4,0	0,4	4,4	3 040,00 €
DEF-03	Historique des revenus Yaya (liste paginée + filtres mois/statut + export CSV)	M	4,0	0,4	4,4	3 040,00 €
DEF-04	Historique des dépenses Parent (liste paginée + filtres + export CSV)	M	3,0	0,3	3,3	2 280,00 €
DEF-05	Flux de confirmation de versement manuel (Parent marque "versé" + notif Yaya)	S	2,0	0,3	2,3	1 610,00 €
DEF-06	Génération reçus PDF mensuels Yaya (WeasyPrint)	M	4,0	0,4	4,4	3 040,00 €
—	Recette & déploiement Phase 4	—	—	2,0	2,0	1 200,00 €

Sous-total Phase 4

	Jours	Montant HT
Développement senior	18,5 j × 700 €	12 950,00 €
Gestion de projet	2,0 j × 600 €	1 200,00 €
Recette & déploiement	2,0 j × 600 €	1 200,00 €
Total Phase 4	22,5 jours	15 350,00 € HT

PHASE 5 — Sécurité et Confiance

Cœur de la valeur produit Bana

Réf.	Prestation	Complexité	Jours dev	Jours GP	Total jours	Prix HT
SEC-01	Confirmation prise en charge : bouton Yaya + notification Parent + horodatage	M	4,0	0,4	4,4	3 040,00 €
SEC-02	Confirmation arrivée enfant : bouton Yaya + notification Parent	S	1,5	0,2	1,7	1 170,00 €
SEC-03	Signalement utilisateur : modèle UserReport , formulaire, interface admin bana_admin	M	4,0	0,4	4,4	3 040,00 €
SEC-04	Blocage utilisateur : modèle UserBlock , action depuis profil, impact matching + chat	M	3,0	0,3	3,3	2 280,00 €
SEC-05	Restriction des avis aux trajets effectués ensemble	S	1,5	0,2	1,7	1 170,00 €
SEC-06	Modération des avis : champs is_published , is_flagged , interface admin	S	2,0	0,3	2,3	1 610,00 €
—	Recette & déploiement Phase 5	—	—	1,5	1,5	900,00 €

Sous-total Phase 5

	Jours	Montant HT
Développement senior	16,0 j × 700 €	11 200,00 €
Gestion de projet	1,8 j × 600 €	1 080,00 €
Recette & déploiement	1,5 j × 600 €	900,00 €
Total Phase 5	19,3 jours	13 180,00 € HT

PHASE 6 — RGPD et Conformité légale

Obligation légale — conformité APD Belgique

Réf.	Prestation	Complexité	Jours dev	Jours GP	Total jours	Prix HT
RGPD-01	Bannière cookie granulaire (3 catégories, stockage consentement, impact SiteVisitMiddleware)	M	4,0	0,4	4,4	3 040,00 €
RGPD-02	Intégration page Politique de Confidentialité (contenu juridique à fournir par le client)	S	1,0	0,2	1,2	820,00 €
RGPD-03	Export données personnelles : génération JSON/ZIP, vue profil, gestion asynchrone	M	4,0	0,4	4,4	3 040,00 €
RGPD-04	Suppression complète du compte : délai 30 jours, email confirmation, anonymisation en cascade	L	7,0	0,7	7,7	5 320,00 €
—	Recette & déploiement Phase 6	—	—	1,5	1,5	900,00 €

Sous-total Phase 6

	Jours	Montant HT
Développement senior	16,0 j × 700 €	11 200,00 €
Gestion de projet	1,7 j × 600 €	1 020,00 €
Recette & déploiement	1,5 j × 600 €	900,00 €
Total Phase 6	19,2 jours	13 120,00 € HT

PHASE 7 — Expérience avancée et Administration

Activation des Formules Confort/Premium et outils de pilotage

Réf.	Prestation	Complexité	Jours dev	Jours GP	Total jours	Prix HT
YAY-01	Tableau de bord Yaya (KPIs mois, prochains trajets, réservations en attente)	M	4,0	0,4	4,4	3 040,00 €
YAY-03	Profil Yaya enrichi (zones de couverture, disponibilités, badges vérification)	S	2,0	0,3	2,3	1 610,00 €

Réf.	Prestation	Complexité	Jours dev	Jours GP	Total jours	Prix HT
YAY-04	Évaluation post-trajet automatique (trigger 24h après, email/push, formulaire)	M	4,0	0,4	4,4	3 040,00 €
MAP-01	Vue carte des matchings (Leaflet.js + OSM + clustering + endpoint GeoJSON)	L	8,0	0,8	8,8	6 080,00 €
MAP-02	Filtres avancés matching (distance, horaire, note min — HTMX)	M	3,0	0,3	3,3	2 280,00 €
MAP-03	Notifications automatiques nouveaux matchings (management command + cron)	M	3,0	0,3	3,3	2 280,00 €
ADM-01	Dashboard business admin (KPIs Stripe, taux conversion, trajets, utilisateurs actifs)	M	5,0	0,5	5,5	3 800,00 €
ADM-02	Export CSV/Excel : membres, réservations, abonnements	M	3,0	0,3	3,3	2 280,00 €
ADM-04	Workflow validation BVM : file d'attente, visualisation doc, commentaire refus, log audit	M	3,0	0,3	3,3	2 280,00 €
ADM-05	Outil emailing groupé admin (segmentation, éditeur, aperçu, envoi)	M	4,0	0,4	4,4	3 040,00 €
MULTI-01	Groupe famille : modèle FamilyGroup, invitations, acceptation, gestion membres	L	5,0	0,5	5,5	3 800,00 €
MULTI-02	Partage des enfants entre membres du groupe famille + impact trajets	M	3,0	0,3	3,3	2 280,00 €
CAL-05	Calendrier familial partagé (agrégation événements groupe famille)	M	3,0	0,3	3,3	2 280,00 €
—	Recette & déploiement Phase 7	—	—	3,0	3,0	1 800,00 €

Sous-total Phase 7

	Jours	Montant HT
Développement senior	50,0 j × 700 €	35 000,00 €
Gestion de projet	5,1 j × 600 €	3 060,00 €
Recette & déploiement	3,0 j × 600 €	1 800,00 €
Total Phase 7	58,1 jours	39 860,00 € HT

Récapitulatif général

Phase	Périmètre	Jours estimés	Montant HT
Phase 0	Corrections critiques et dette technique	14,2 j	9 670,00 €
Phase 1	Messagerie temps réel	22,5 j	15 350,00 €
Phase 2	Système de notifications	18,1 j	12 360,00 €
Phase 3	Calendrier et planification	23,5 j	16 050,00 €
Phase 4	Défraiement et paiements	22,5 j	15 350,00 €
Phase 5	Sécurité et confiance	19,3 j	13 180,00 €
Phase 6	RGPD et conformité	19,2 j	13 120,00 €
Phase 7	Expérience avancée et administration	58,1 j	39 860,00 €
Sous-total développement		197,4 j	134 940,00 €

Réserve de contingence

Une réserve de **10 %** est appliquée pour couvrir les aléas techniques, les ajustements de spécifications en cours de développement et les intégrations imprévues avec des services tiers (Stripe, WebSocket, PostGIS).

	Montant HT
Sous-total développement	134 940,00 €
Réserve de contingence (10 %)	13 494,00 €

	Montant HT
Total avant TVA	148 434,00 € HT

Récapitulatif financier

Total développement (197,4 jours)	134 940,00 € HT
Réserve de contingence (10 %)	13 494,00 € HT
TOTAL HT	148 434,00 € HT
TVA 21 %	31 171,14 €
TOTAL TTC	179 605,14 € TTC

Options et variantes

Option A — Périmètre prioritaire (Phases 0 + 1 + 2 + 6)

Corriger les bugs critiques + messagerie + notifications + RGPD

Phase	Montant HT
Phase 0 — Corrections critiques	9 670,00 €
Phase 1 — Messagerie	15 350,00 €
Phase 2 — Notifications	12 360,00 €
Phase 6 — RGPD	13 120,00 €
Contingence 10 %	5 050,00 €
Total Option A HT	55 550,00 € HT
TVA 21 %	11 665,50 €
Total Option A TTC	67 215,50 € TTC

Durée estimée : 10-14 semaines

Option B — Périmètre commercial (Phases 0 à 4)

Activer la Formule Confort : messagerie + notifications + calendrier + défraiement

Phase	Montant HT
Phase 0 — Corrections critiques	9 670,00 €
Phase 1 — Messagerie	15 350,00 €
Phase 2 — Notifications	12 360,00 €
Phase 3 — Calendrier	16 050,00 €
Phase 4 — Défraiement	15 350,00 €
Contingence 10 %	6 878,00 €
Total Option B HT	75 658,00 € HT
TVA 21 %	15 888,18 €
Total Option B TTC	91 546,18 € TTC

Durée estimée : 24-30 semaines

Option C — Périmètre complet (Phases 0 à 7)

Plateforme complète prête pour Formules Essentiel, Confort et Premium

	Montant HT
Total Option C HT	148 434,00 € HT
TVA 21 %	31 171,14 €
Total Option C TTC	179 605,14 € TTC

Durée estimée : 40-53 semaines

Modalités de paiement

Phasage de facturation

La facturation est réalisée **par phase livrée et recettée** selon le calendrier suivant :

Facturation	Montant	Condition
Acompte démarrage	30 % du total phase	À la signature du bon de commande

Facturation	Montant	Condition
Mi-phase	40 % du total phase	À mi-parcours (point d'avancement validé)
Solde phase	30 % du total phase	À la livraison et recette validée

Conditions générales de paiement

- **Délai de paiement** : 30 jours date de facture
- **Mode de paiement** : virement bancaire (IBAN communiqué sur facture)
- **Pénalités de retard** : taux légal belge en vigueur + indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €
- **Bon de commande** : un bon de commande signé est requis avant tout démarrage de phase

Conditions d'exécution

Responsabilités du prestataire (Digit-Up Agency)

- Développement conforme au Cahier des Charges v1.0 du 19/06/2026
- Livraison du code source versionné (Git) à chaque fin de phase
- Rédaction des migrations Django et documentation technique associée
- Tests unitaires sur les nouvelles fonctionnalités
- Support pendant la recette : 10 jours ouvrables après chaque livraison
- Déploiement en production ou assistance au déploiement

Responsabilités du client (BanaCommunity)

- Fourniture des accès nécessaires (serveur, Git, Stripe, services tiers) dans les 5 jours ouvrables suivant la signature
- Fourniture du contenu textuel requis (politique de confidentialité, textes légaux)
- Désignation d'un interlocuteur unique côté client pour les validations fonctionnelles
- Validation ou retours sur livraisons dans un délai de **10 jours ouvrables**
- Toute demande de modification hors périmètre CDC fera l'objet d'un avenant

Gestion des modifications de périmètre

Toute demande de modification du périmètre défini dans le CDC fera l'objet :

1. D'une analyse d'impact (gratuite, ≤ 2h)
2. D'un avenant chiffré soumis à validation
3. D'un ajustement du planning si nécessaire

Propriété intellectuelle


À la livraison complète et au règlement intégral de chaque phase, BanaCommunity devient propriétaire du code source développé dans le cadre du présent devis. Les bibliothèques open

source utilisées (Django, Tailwind, Leaflet, FullCalendar, etc.) restent soumises à leurs licences respectives.

Confidentialité

Digit-Up Agency s'engage à maintenir la confidentialité de toutes les informations relatives au projet BanaCommunity. Un accord de confidentialité (NDA) peut être signé à la demande du client.

Planning indicatif (périmètre complet)

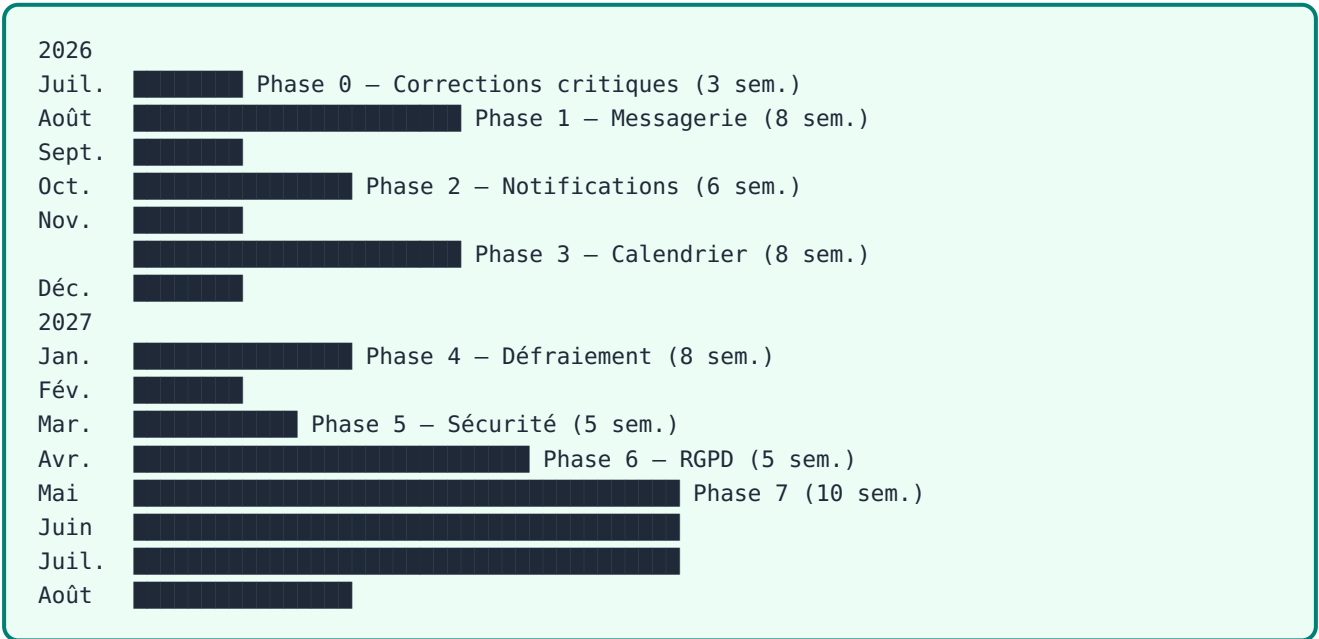

Planning conditionné à la signature et au démarrage avant le 01/08/2026. Décalages possibles selon disponibilités des ressources et retours client.

Validité et acceptation

Le présent devis est valable **60 jours** à compter de sa date d'émission, soit jusqu'au **19/08/2026**.

Pour acceptation, merci de retourner ce document signé accompagné d'un bon de commande à : **contact@digit-up.be**

Lu et approuvé – Bon pour accord

Fait à _____, le _____

Pour BanaCommunity :

Nom : _____

Fonction : _____

Signature : _____

Pour Digit-Up Agency :

Nom : Raphaël Jonard

Fonction : Directeur Technique

Signature : _____

Digit-Up Agency — Rue de Marcinelle 12 — 6000 Charleroi — Belgique

BCE : 0XXX.XXX.XXX — TVA : BE 0XXX.XXX.XXX — IBAN : BEXX XXXX XXXX XXXX

contact@digit-up.be — www.digit-up.be
